

# 인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축사업

Iteration2 3차

3자 단위테스트 수행 결과 보고 ( 04. 03)



## I. 3자 테스트 수행

1. 개요
2. 테스트 방법
3. 테스트 결과 기록

## II. 테스트 수행 결과

1. 테스트 결과
2. 결함 조치 현황

## III. 테스트 수행 결과

1. 유효 결함 현황 분석
2. 정량적 결함 분석
3. 결함 원인 분석
4. 결함 사례 ( 심각도별 )
5. 결함 사례 ( 유형별 )
6. 재발 방지 방안

※ 참고 ) 테스트 사전 점검결과

※ 참고 ) 테스트 수행 중 테스터 Daily Review : 문제점 / 개선점

통합정보시스템 개발완료 된 기능에 대해 3자 단위테스트를 통해 기능 적합성 및 사용자 사용성 측면에서 취약한 부분을 재점검하고 보완하여 개발 품질 수준을 높이고자 함

## □ 목적

- 3자 관점의 독립적인 테스트를 통한 현재 품질수준을 확인
- 주요 기능에 대한 취약점을 사전 노출하여 고객 release 전 신뢰성 있는 품질 수준의 확보

## □ 품질 측면의 검증 사항

- 기능 확인  
테스트 시나리오 기반한 기능 및 정상 동작 여부 확인
- 사용성 검증  
실 사용자 관점에서 사용 편의성 및 직관성, 사용성 검증

## □ 테스트 대상

- 총 17개 업무 온라인(화면기준), 함수/프로시저 : 440 건
  - 운항정보관리 : 운항계획, 자원배정, 비상계획, A-CDM, 공통관리,항공기관제
  - 공항운영관리 : 예측관리, 항공보안, 공항운영, 항공통계포털, 공통관리
  - 상용 및 모바일 : 자원배정엔진, 자원배정차트, SLOT , PUSH, WES, MES

## □ 테스트 일정 및 조직

- 일정 : 03/23 ~ 03/27 (5일)
  - . 신규기능검증 수행 (440건 시나리오)
  - \* 테스트 성공률 및 결함 현황(04/03, 08:30 기준)
  - . 리뷰 (04/03)
  - . 결함 조치 (~04/03)
- Tester (6명)
  - 윤성훈 차장, 김철현 차장, 박선용 차장, 최유림 과장
  - 김승무 위원, 최중혁 사원

테스트결과서를 기반으로 테스트케이스에 대하여 테스트 진행

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업

단위테스트결과서[공통관리(AOMS\_CA)]

I. 단위 시험 케이스

|         |                                                                                                                                                                                 |       |         |            |     |     |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----|-----|------------|
| 단위시험ID  | UT-A_CASY050S                                                                                                                                                                   | 단위시험명 | 접속자 현황  | 작성자        | 박영수 | 작성일 | 2024.12.30 |
| 개요      | 현재 접속한 사용자 현황을 모니터링한다.                                                                                                                                                          |       |         |            |     |     |            |
| 프로그램ID  | CASY050S.xfdl, UserSessHstryController.java, UserSessHstryService.java, UserSessHstryServiceImpl.java, UserSessHstryMapper.java, UserSessHstryDto.java, UserSessHstryMapper.xml |       |         |            |     |     |            |
| 1차 시험결과 | 2025/12/15                                                                                                                                                                      | 최민지   | 2차 시험결과 | 2025/12/16 | 박영수 |     |            |

|    |                                       |                            |                     |          |                |               |                 |           |
|----|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 순번 | 시험 내용                                 | 시험데이터                      | 예상 결과               | 실제 결과    | [1차] 개발자<br>일자 | 수행결과<br>(P/F) | [2차] 업무PL<br>일자 | 수행결과(P/F) |
| 1  | 화면로딩<br>- 화면 LOAD시 초기이미지 및 화면내용 확인한다. |                            | 현재 기준 접속자 현황을 표출한다. | 예상결과와 동일 | 2025/12/15     | P             | 2025/12/16      | P         |
| 2  | [조회]<br>조회조건에 따른 조회기능 정상 수행여부 점검      | [조회조건]<br>- User ID : test | 해당 조건의 조회 결과를 보여준다. | 예상결과와 동일 | 2025/12/15     | P             | 2025/12/16      | P         |

TMS(테스트관리시스템) 에 결함 등재 후 관리  
테스트 차수 : 2-3차

Easy-ware  
Test Management

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축

프로젝트기준관리

개발진행관리

단위테스트관리

통합테스트관리

참여프로젝트

프로젝트현황

단위테스트 실적 등록

단위테스트관리 > 단위테스트 실적 등록

테스트 차수: 2-3차

경로: 공통관리(FIMS-CA)

경로담당: 김명준

업무분류1: - 전체 -

업무분류2: - 전체 -

성공여부: - 전체 -

테스터:

시나리오ID:

시나리오명:

시나리오 목록

| 상태 | 업무분류1   | 업무분류2 | 시나리오ID      | 시나리오명           | 참조파일 | 개발자 | 상태 | 테스트단계  | 테스터      |    |
|----|---------|-------|-------------|-----------------|------|-----|----|--------|----------|----|
|    | 화면구성    | 화면구성  | UT-CAMN009M | 도움말             |      | 김명준 | 완료 | 개발자테스트 | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | PL테스트  | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | 3자테스트  | 3자테스터... | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 공사테스트  | 장수정      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     |    | 현업테스트  | 현업테스터    | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 감리테스트  | 박광엽      | 20 |
|    | 시스템운영관리 | 시스템관리 | UT-CASY070M | 테이블제너레이터/자바편집기  |      | 정연준 | 완료 | 개발자테스트 | 정연준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | PL테스트  | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | 3자테스트  | 3자테스터... | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 공사테스트  | 공사테스터    | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     |    | 현업테스트  | 현업테스터    | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 감리테스트  | 박광엽      | 20 |
|    |         | 이력관리  | UT-CASY038S | EAI 인터페이스 수신 이력 |      | 김명준 | 완료 | 개발자테스트 | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | PL테스트  | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | 3자테스트  | 3자테스터... | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 공사테스트  | 장수정      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     |    | 현업테스트  | 현업테스터    | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 감리테스트  | 박광엽      | 20 |
|    |         |       | UT-CASY039S | EAI 인터페이스 송신 이력 |      | 김명준 | 완료 | 개발자테스트 | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | PL테스트  | 김명준      | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 완료 | 3자테스트  | 3자테스터... | 20 |
|    |         |       |             |                 |      |     | 요청 | 공사테스트  | 장수정      | 20 |

단위 테스트 결과서 내 테스트 케이스 기록으로 결함을 명확하게 식별 할 수 있도록 함

[S\_#]

시나리오

[C\_#]

공통체크리스트

[X\_#]

기타

| 인천국제공항 통합증   |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. 단위 시험 케이스 |                        |
| 단위시험ID       |                        |
| 개요           |                        |
| 프로그램 ID      | AI                     |
| 1차 시험결과      |                        |
| 순번           |                        |
| 1            | 출발항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인 |
| 2            | 도착항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인 |
| 3            | 관제석 변경에 는가?            |
| 4            | Push-back 승 가?         |

| 인천국제공항 통합증 |    |    |
|------------|----|----|
| 순번         | 구분 |    |
| 1          | 화면 | 표준 |
| 2          | 화면 | 표준 |
| 3          | 화면 | 표준 |
| 4          | 화면 | 표준 |
| 5          | 화면 | 표준 |
| 6          | 화면 | 표준 |
| 7          | 화면 | 표준 |
| 8          | 화면 | 표준 |
| 9          | 화면 | 표준 |
| 10         | 화면 | 표준 |
| 11         | 화면 | 표준 |
| 12         | 화면 | 표준 |
| 13         | 화면 | 표준 |
| 14         | 화면 | 표준 |
| 15         | 화면 | 표준 |
| 16         | 화면 | 표준 |
| 17         | 화면 | 표준 |
| 18         | 화면 | 표준 |
| 19         | 화면 | 보안 |
| 20         | 화면 | 보안 |
| 21         | 화면 | 보안 |
| 22         | 화면 | 시각 |

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-AS38101S ] 첨부일 실적(운항실적)

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[ - ] 진행 [ DEF-04617 ] [ 그리드 공통 ] [ S\_8 ] [ S\_9 ] 고정된 열의 데이터 영역 z-index가 필터 영역 z-index보다 높아서 필터 영역이 데이터 영역 ...

결함검토요청 [ 3자테스트 공통은성 ] 2026-03-25

처리내용 결함내용

|       |         |      |    |     |       |
|-------|---------|------|----|-----|-------|
| 결함구분  | 결함      | 결함유형 | UI | 심각도 | Minor |
| 완료목표일 | ← PL 입력 |      |    |     |       |
| 참조파일  | 찾기      |      |    |     |       |

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결함내용 | [ 그리드 공통 ] [ S_8 ] [ S_9 ] 고정된 열의 데이터 영역 z-index가 필터 영역이 데이터 영역 고정된 열 고정 가능하지만, 열 부탁드립니다. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

[S\_8]



- 식별 결함 : 128건, 98개 시나리오
- 주1) 유효 결함 : 89건, 71개 시나리오
- 결함 발생율 : 22.6 % ( 테스트 대상 시나리오 기준 440개 중 유효결함 32개 시나리오)

조치기한 내 목표 조치완료율 : 전체 - 80%  
결함 - 95%  
개선/변경 - 80%

※테스트 성공률 및 결함 현황(04/03, 08:30 기준)

| 업무영역               |               | 테스트 수행결과 |         |         |            |                          |              |        |             | 결함 현황 |    |    |     | 조치현황 |     | 조치율    |       |
|--------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|--------------------------|--------------|--------|-------------|-------|----|----|-----|------|-----|--------|-------|
|                    |               | 대상<br>T  | 실패<br>F | 성공<br>S | 수행건수<br>FP | 잔여 건수<br>LT<br>=( S-FP ) | 수행율<br>=FP/T | 성공율    | 결함율<br>F/FP | 개선/변경 | 결함 | 신규 | 계   | 조치완료 | 조치중 |        |       |
| 공항운영<br>관리<br>AOMS | 예측관리(PM)      | 29       | 2       | 27      | 29         | 0                        | 100.0%       | 93.1%  | 6.9%        | 0     | 4  | 0  | 4   | 4    | 0   | 100.0% | 23.9% |
|                    | 항공보안(FS)      | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 공항운영(GO)      | 28       | 17      | 11      | 28         | 0                        | 100.0%       | 39.3%  | 60.7%       | 0     | 19 | 2  | 21  | 4    | 17  | 19.0%  |       |
|                    | 항공통계포털(AS)    | 121      | 13      | 67      | 80         | 41                       | 66.1%        | 83.8%  | 16.3%       | 3     | 15 | 0  | 18  | 0    | 18  | 0.0%   |       |
|                    | 공통관리(AOMS-CA) | 7        | 1       | 6       | 7          | 0                        | 100.0%       | 85.7%  | 14.3%       | 0     | 3  | 0  | 3   | 3    | 0   | 100.0% |       |
| 운항정보<br>관리<br>FIMS | A-CDM(CM)     | 36       | 0       | 36      | 36         | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% | 70.4% |
|                    | 공통관리(FIMS-CA) | 13       | 1       | 12      | 13         | 0                        | 100.0%       | 92.3%  | 7.7%        | 1     | 4  | 0  | 5   | 5    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 비상계획(CP)      | 20       | 4       | 16      | 20         | 0                        | 100.0%       | 80.0%  | 20.0%       | 3     | 0  | 0  | 3   | 2    | 1   | 66.7%  |       |
|                    | 운항계획(FP)      | 68       | 14      | 54      | 68         | 0                        | 100.0%       | 79.4%  | 20.6%       | 12    | 3  | 0  | 15  | 15   | 0   | 100.0% |       |
|                    | 자원배정(RS)      | 30       | 12      | 18      | 30         | 0                        | 100.0%       | 60.0%  | 40.0%       | 5     | 10 | 0  | 15  | 8    | 7   | 53.3%  |       |
|                    | 항공기관제(AC)     | 16       | 10      | 6       | 16         | 0                        | 100.0%       | 37.5%  | 62.5%       | 6     | 10 | 0  | 16  | 8    | 8   | 50.0%  |       |
| 상용                 | 자원배정차트(RC)    | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% | 71.4% |
|                    | SLOT관리(SLOT)  | 6        | 2       | 4       | 6          | 0                        | 100.0%       | 66.7%  | 33.3%       | 2     | 0  | 0  | 2   | 1    | 1   | 50.0%  |       |
|                    | 모바일(MES)      | 21       | 6       | 15      | 21         | 0                        | 100.0%       | 71.4%  | 28.6%       | 3     | 7  | 0  | 10  | 6    | 4   | 60.0%  |       |
|                    | 모바일(WES)      | 44       | 8       | 36      | 44         | 0                        | 100.0%       | 81.8%  | 18.2%       | 11    | 5  | 0  | 16  | 13   | 3   | 81.3%  |       |
|                    | 자원배정엔진(RE)    | 1        | 0       | 1       | 1          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 푸시SW(PUSH)    | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
| 총합계                |               | 440      | 90      | 309     | 399        | 41                       | 90.7%        | 77.4%  | 22.6%       | 46    | 80 | 2  | 128 | 69   | 59  | 53.9%  |       |

\* 주1) 유효 결함 : 결함이 기각 되지 않고, 조치 진행하는 결함

조치 완료 기준

- 결함 기각
- 결함조치 후 테스터 최종 확인
- 결함조치 후 테스터 확인 대기

아시아나 IDT 컨소시엄

- 식별 결함 : 128건, 98개 시나리오
- 주1) 유효 결함 : 89건, 71개 시나리오
- 결함 발생율 : 22.6 % ( 테스트 대상 시나리오 기준 440개 중 유효결함 32개 시나리오)

조치기한 내 목표 조치완료율 : 전체 - 80%  
결함 - 95%  
개선/변경 - 80%

※테스트 성공률 및 결함 현황(04/03, 08:30 기준)

| 업무영역               |               | 테스트 수행결과 |         |         |            |                          |              |        |             | 결함 현황 |    |    |     | 조치현황 |     | 조치율    |       |
|--------------------|---------------|----------|---------|---------|------------|--------------------------|--------------|--------|-------------|-------|----|----|-----|------|-----|--------|-------|
|                    |               | 대상<br>T  | 실패<br>F | 성공<br>S | 수행건수<br>FP | 잔여 건수<br>LT<br>=( S-FP ) | 수행율<br>=FP/T | 성공율    | 결함율<br>F/FP | 개선/변경 | 결함 | 신규 | 계   | 조치완료 | 조치중 |        |       |
| 공항운영<br>관리<br>AOMS | 예측관리(PM)      | 29       | 2       | 27      | 29         | 0                        | 100.0%       | 93.1%  | 6.9%        | 0     | 4  | 0  | 4   | 4    | 0   | 100.0% | 23.9% |
|                    | 항공보안(FS)      | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 공항운영(GO)      | 28       | 17      | 11      | 28         | 0                        | 100.0%       | 39.3%  | 60.7%       | 0     | 19 | 2  | 21  | 4    | 17  | 19.0%  |       |
|                    | 항공통계포털(AS)    | 121      | 13      | 67      | 80         | 41                       | 66.1%        | 83.8%  | 16.3%       | 3     | 15 | 0  | 18  | 0    | 18  | 0.0%   |       |
|                    | 공통관리(AOMS-CA) | 7        | 1       | 6       | 7          | 0                        | 100.0%       | 85.7%  | 14.3%       | 0     | 3  | 0  | 3   | 3    | 0   | 100.0% |       |
| 운항정보<br>관리<br>FIMS | A-CDM(CM)     | 36       | 0       | 36      | 36         | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% | 70.4% |
|                    | 공통관리(FIMS-CA) | 13       | 1       | 12      | 13         | 0                        | 100.0%       | 92.3%  | 7.7%        | 1     | 4  | 0  | 5   | 5    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 비상계획(CP)      | 20       | 4       | 16      | 20         | 0                        | 100.0%       | 80.0%  | 20.0%       | 3     | 0  | 0  | 3   | 2    | 1   | 66.7%  |       |
|                    | 운항계획(FP)      | 68       | 14      | 54      | 68         | 0                        | 100.0%       | 79.4%  | 20.6%       | 12    | 3  | 0  | 15  | 15   | 0   | 100.0% |       |
|                    | 자원배정(RS)      | 30       | 12      | 18      | 30         | 0                        | 100.0%       | 60.0%  | 40.0%       | 5     | 10 | 0  | 15  | 8    | 7   | 53.3%  |       |
|                    | 항공기관제(AC)     | 16       | 10      | 6       | 16         | 0                        | 100.0%       | 37.5%  | 62.5%       | 6     | 10 | 0  | 16  | 8    | 8   | 50.0%  |       |
| 상용                 | 자원배정차트(RC)    | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% | 71.4% |
|                    | SLOT관리(SLOT)  | 6        | 2       | 4       | 6          | 0                        | 100.0%       | 66.7%  | 33.3%       | 2     | 0  | 0  | 2   | 1    | 1   | 50.0%  |       |
|                    | 모바일(MES)      | 21       | 6       | 15      | 21         | 0                        | 100.0%       | 71.4%  | 28.6%       | 3     | 7  | 0  | 10  | 6    | 4   | 60.0%  |       |
|                    | 모바일(WES)      | 44       | 8       | 36      | 44         | 0                        | 100.0%       | 81.8%  | 18.2%       | 11    | 5  | 0  | 16  | 13   | 3   | 81.3%  |       |
|                    | 자원배정엔진(RE)    | 1        | 0       | 1       | 1          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
|                    | 푸시SW(PUSH)    | 0        | 0       | 0       | 0          | 0                        | 100.0%       | 100.0% | 0.0%        | 0     | 0  | 0  | 0   | 0    | 0   | 100.0% |       |
| 총합계                |               | 440      | 90      | 309     | 399        | 41                       | 90.7%        | 77.4%  | 22.6%       | 46    | 80 | 2  | 128 | 69   | 59  | 53.9%  |       |

\* 주1) 유효 결함 : 결함이 기각 되지 않고, 조치 진행하는 결함

조치 완료 기준

- 결함 기각
- 결함조치 후 테스터 최종 확인
- 결함조치 후 테스터 확인 대기

아시아나 IDT 컨소시엄

전체 결함, 개선/변경, 신규 - 128건

조치기한 내 목표 조치완료율 : 전체 - 80%  
결함 - 95%  
개선/변경 - 80%

- **확인 대기** : 결함 조치 후 테스터로 [확인요청] 상태
- **확인 요청** : PL 혹은 개발자 간 결함내용의 [확인요청] 상태
- **조치 완료** : 결함등록기각 + 확인대기 + 최종확인

목표 미달성

\* \* \*

| 업무영역          | 결함검토요청 | 결함등록기각 | 재조치요청 | 조치요청 | 최종확인 | 확인대기 | 확인요청 | 총합계 | 조치완료 | 미조치 | 조치율    |
|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------|
| A-CDM(CM)     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| SLOT관리(SLOT)  | 1      | 0      | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 2   | 1    | 1   | 50.0%  |
| 공통관리(AOMS-CA) | 0      | 1      | 0     | 0    | 1    | 1    | 0    | 3   | 3    | 0   | 100.0% |
| 공통관리(FIMS-CA) | 0      | 2      | 0     | 0    | 3    | 0    | 0    | 5   | 5    | 0   | 100.0% |
| 공항운영(GO)      | 17     | 4      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 21  | 4    | 17  | 19.0%  |
| 모바일(MES)      | 0      | 4      | 0     | 4    | 0    | 2    | 0    | 10  | 6    | 4   | 60.0%  |
| 모바일(WES)      | 0      | 7      | 0     | 0    | 0    | 6    | 3    | 16  | 13   | 3   | 81.3%  |
| 비상계획(CP)      | 0      | 1      | 0     | 1    | 1    | 0    | 0    | 3   | 2    | 1   | 66.7%  |
| 예측관리(PM)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 2    | 2    | 0    | 4   | 4    | 0   | 100.0% |
| 운항계획(FP)      | 0      | 10     | 0     | 0    | 0    | 5    | 0    | 15  | 15   | 0   | 100.0% |
| 자원배정(RS)      | 6      | 3      | 0     | 1    | 5    | 0    | 0    | 15  | 8    | 7   | 53.3%  |
| 자원배정엔진(RE)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 자원배정차트(RC)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공기관제(AC)     | 0      | 7      | 0     | 4    | 0    | 1    | 4    | 16  | 8    | 8   | 50.0%  |
| 항공보안(FS)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공통계포털(AS)    | 18     | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 18  | 0    | 18  | 0.0%   |
| 총합계           | 42     | 39     | 0     | 10   | 12   | 18   | 7    | 128 | 69   | 59  | 53.9%  |



결함  
조치 현황

| 업무영역          | 결함검토요청 | 결함등록기각 | 재조치요청 | 조치요청 | 최종확인 | 확인대기 | 확인요청 | 총합계 | 조치완료 | 미조치 | 조치율    |
|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------|
| A-CDM(CM)     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| SLOT관리(SLOT)  | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 공통관리(AOMS-CA) | 0      | 1      | 0     | 0    | 1    | 1    | 0    | 3   | 3    | 0   | 100.0% |
| 공통관리(FIMS-CA) | 0      | 2      | 0     | 0    | 2    | 0    | 0    | 4   | 4    | 0   | 100.0% |
| 공항운영(GO)      | 17     | 2      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 19  | 2    | 17  | 10.5%  |
| 모바일(MES)      | 0      | 4      | 0     | 2    | 0    | 1    | 0    | 7   | 5    | 2   | 71.4%  |
| 모바일(WES)      | 0      | 4      | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 5   | 5    | 0   | 100.0% |
| 비상계획(CP)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 예측관리(PM)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 2    | 2    | 0    | 4   | 4    | 0   | 100.0% |
| 운항계획(FP)      | 0      | 2      | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 3   | 3    | 0   | 100.0% |
| 자원배정(RS)      | 6      | 2      | 0     | 0    | 2    | 0    | 0    | 10  | 4    | 6   | 40.0%  |
| 자원배정엔진(RE)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 자원배정차트(RC)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공기관제(AC)     | 0      | 3      | 0     | 3    | 0    | 1    | 3    | 10  | 4    | 6   | 40.0%  |
| 항공보안(FS)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공통계포털(AS)    | 15     | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 15  | 0    | 15  | 0.0%   |
| 총합계           | 38     | 20     | 0     | 5    | 7    | 7    | 3    | 80  | 34   | 46  | 42.5%  |

조치완료율

[ 결함 ]

목표 - 95.0 %  
실적 - 42.5 %

목표 미달성

개선,신규  
조치 현황

| 업무영역          | 결함검토요청 | 결함등록기각 | 재조치요청 | 조치요청 | 최종확인 | 확인대기 | 확인요청 | 총합계 | 조치완료 | 미조치 | 조치율    |
|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------|
| A-CDM(CM)     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| SLOT관리(SLOT)  | 1      | 0      | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 2   | 1    | 1   | 50.0%  |
| 공통관리(AOMS-CA) | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 공통관리(FIMS-CA) | 0      | 0      | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 1   | 1    | 0   | 100.0% |
| 공항운영(GO)      | 0      | 2      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 2   | 2    | 0   | 100.0% |
| 모바일(MES)      | 0      | 0      | 0     | 2    | 0    | 1    | 0    | 3   | 1    | 2   | 33.3%  |
| 모바일(WES)      | 0      | 3      | 0     | 0    | 0    | 5    | 3    | 11  | 8    | 3   | 72.7%  |
| 비상계획(CP)      | 0      | 1      | 0     | 1    | 1    | 0    | 0    | 3   | 2    | 1   | 66.7%  |
| 예측관리(PM)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 운항계획(FP)      | 0      | 8      | 0     | 0    | 0    | 4    | 0    | 12  | 12   | 0   | 100.0% |
| 자원배정(RS)      | 0      | 1      | 0     | 1    | 3    | 0    | 0    | 5   | 4    | 1   | 80.0%  |
| 자원배정엔진(RE)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 자원배정차트(RC)    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공기관제(AC)     | 0      | 4      | 0     | 1    | 0    | 0    | 1    | 6   | 4    | 2   | 66.7%  |
| 항공보안(FS)      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   | 100.0% |
| 항공통계포털(AS)    | 3      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 3   | 0    | 3   | 0.0%   |
| 총합계           | 4      | 19     | 0     | 5    | 5    | 11   | 4    | 48  | 35   | 13  | 72.9%  |

[ 개선/변경 ]

목표 - 80.0 %  
실적 - 72.9 %

목표 미달성

☰

전체 등록 결함  
128건

테스트 수행 기간 동안 등록된  
모든 결함, 개선/변경, 신규 합계

⚠

유효 결함 (ACTION TARGET)  
89건

비중 69.5%


실제 수정 및 조치가 필요한 항목

🚫

기각/ 제외  
39건

요건 변경, 중복, 오판 등으로 인한  
비유효 데이터 (노이즈)

결함 유효성 검증 결과

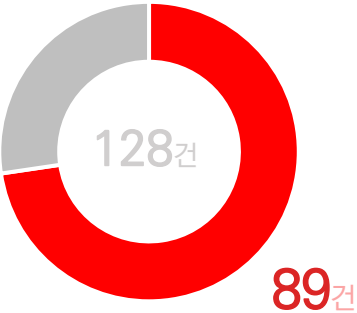

| 구분      | 건수  | 비중    | 비고          |
|---------|-----|-------|-------------|
| ● 유효 결함 | 89  | 69.5% | 실제 수정/조치 필요 |
| ● 기각/제외 | 39  | 30.5% | 결함 아님, 중복 등 |
| 총계      | 128 | 100%  |             |

⚙

집중 관리 대상 (TOP 3 HOTSPOTS)

♦ 공항운영 21건

♦ 공항통계 18건

♦ 자원배정 12건

기각(Rejected) 사유 분석

Total 39건

- 📄

결함 오판


테스터의 로직 이해 부족으로 정상 기능을 결함으로 오판한 사례  
[ DEF-04529 ]  
테스트 결과서 Create Flight Shere는 시스템 메뉴에는 보이지 않음  
⇒ 현황 : 조회 목록에서 ROW 클릭 시 표출되는 기능임
- ✓

환경 설정 미흡

표준 화면 해상도(1920\*1080) 미설정  
[ DEF-04516 ]  
CodeShere Check 아이콘 찢림


1) 심각도(Severity) 별 분포

| 구분       | 건수  | 비중    | 현상                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critical | 3건  | 3.2%  | [ 현상 ]<br>DEF-04655 : 기준일자를 제외한 다른 항목으로 검색이 불가능합니다<br>DEF-04461 : 메뉴 접근 시 '-1 error : 데이터 예외사항입니다. 입력하신 데이터를 확인해 주세요.' 라는 alert이 표출되어 조회가 불가능합니다.<br>[ 주요 업무영역 ]<br>• 공항운영(GO), 모바일(MES)                                     |
| Major    | 32건 | 34.4% | [ 현상 ]<br>DEF-04503 : 엑셀 다운로드 버튼 클릭시 아무 작동이 안됨<br>DEF-04587 : '+', '-' 버튼이 보이지 않습니다(표출 선행조건이 있는 것인지 모르겠습니다).<br>DEF-04742 : 터미널을 바꾸고 검색해도 차트 모양이 변하지 않음.<br>[ 주요 업무영역 ]<br>• 공항운영(GO), 예측관리(PM), 자원배정(RS)                    |
| Minor    | 58건 | 62.4% | [ 현상 ]<br>DEF-04696 : contract end date 날짜 크기가 다름<br>DEF-04528 : STATUS LIST BOX 상단 전체 표기<br>DEF-04444 : 메시지가 부정확함. NAME 혹은 vALUE를 입력하지 않으면 서버오류라고 메시지 처리 됨 --> 필수항목 오류로 표기<br>[ 주요 업무영역 ]<br>• 공항운영(GO), 공항통계(AS), 자원배정(RS) |

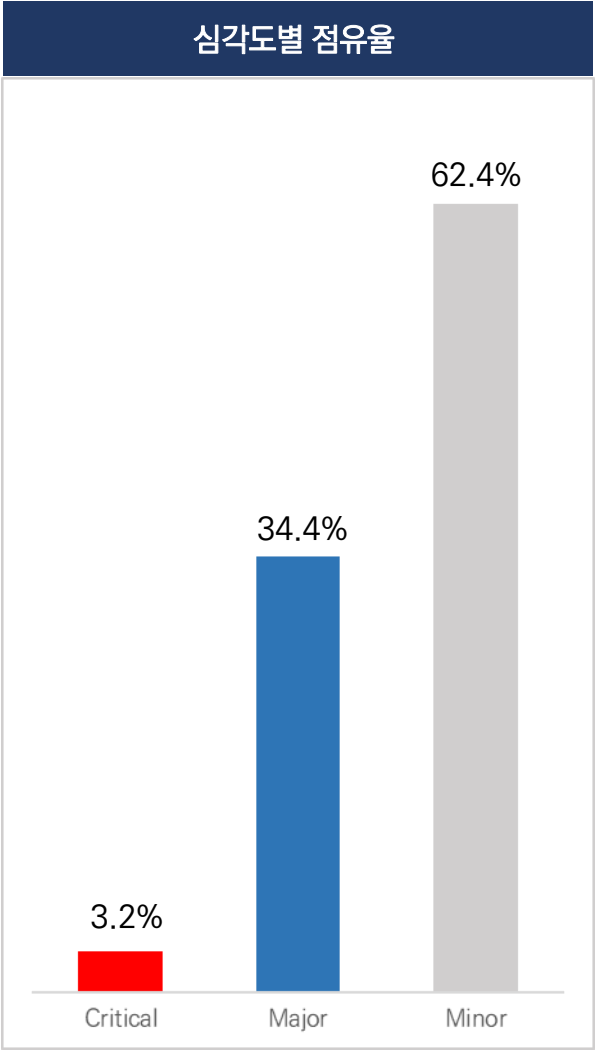


2) 결함 주요 유형(Defect Type) 별 분포

| 결함 유형   | 건수  | 비중    | 주요 분석 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기능      | 41건 | 44.1% | <ul style="list-style-type: none"><li>DEF-04457 : 삭제 시 '-1 error : 시스템 장애로 인해 서비스가 중단되었습니다.' 라는 alert이 표출됩니다.</li><li>DEF-04587 : '+', '-' 버튼이 보이지 않습니다(표출 선행조건이 있는 것인지 모르겠습니다).</li><li>DEF-04741 : 터미널을 바꾸고 검색해도 차트 모양이 변하지 않음.</li><li>DEF-04445 : '수치가 부적합합니다' 라는 에러가 발생합니다.</li></ul>             |
| 공통/UI   | 33건 | 35.5% | <ul style="list-style-type: none"><li>DEF-04440 : 화면의 첫 째 필드에 커서가 Set focusc 확인</li><li>DEF-04528 : STATUS LIST BOX 상단 전체 표기</li><li>DEF-04464 : '선택적 개인정보 수집 이용내역' 이 '필수'가 아닌 '선택' 항목으로 동작하지만 같은 '[필수]' section 하에 존재하여 '필수'로 느껴집니다. 선택 항목이라면 section을 분리 하거나, (선택) 등으로 명확히 분리하면 좋을 것 같습니다.</li></ul> |
| 데이터     | 6건  | 6.5%  | <ul style="list-style-type: none"><li>DEF-04638 : 데이터가 존재하지 않아 확인이 불가능합니다.</li><li>DEF-04661 : 데이터가 존재하지 않아 확인이 어렵습니다.</li><li>DEF-04781 : 1.2조회테스트 직행(조건에 맞는 데이터 부재_코멘트 있음)</li></ul>                                                                                                                 |
| 문서화 /기타 | 13건 | 14.0% | <ul style="list-style-type: none"><li>DEF-04539 : 단위시험시나리오의 시험데이터와 검색 컴포넌트의 입력 가능 항목이 서로 상이합니다.</li><li>DEF-04527 : 단위테스트결과서상에는 조회 시작 일자 및 종료 일자가 존재하나 실제론 단 일 날짜 조회만 가능합니다(증적과 상이).</li><li>DEF-04504 : 단위테스트 결과서 확인 필요 (시나리오ID : GO12505 중복으로 보임) .</li></ul>                                        |
| 합계      | 93건 | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

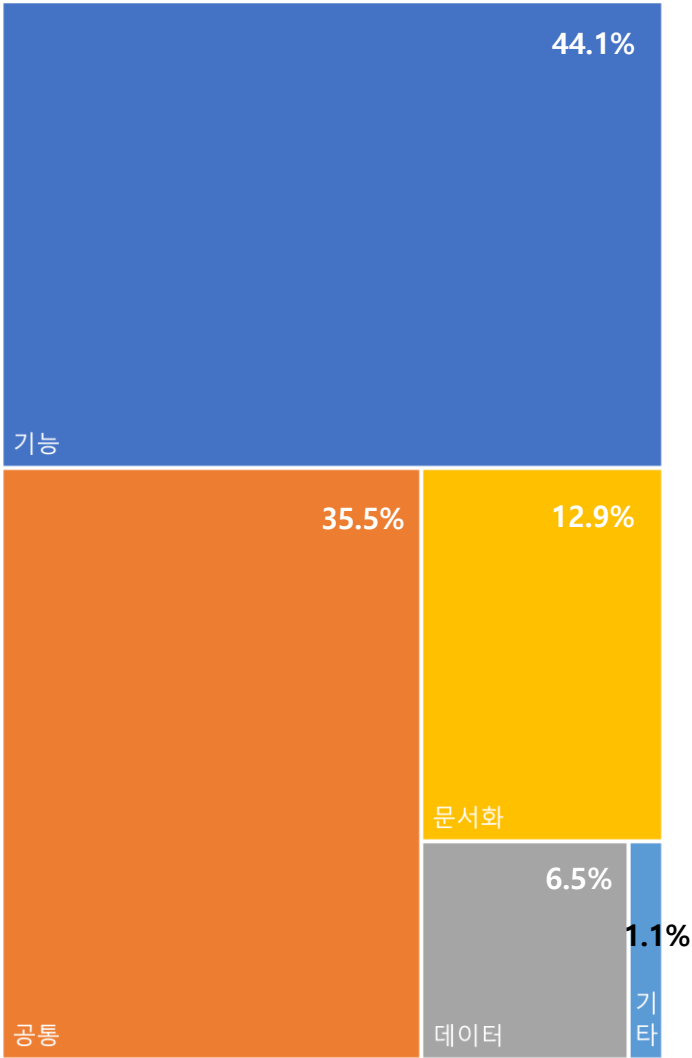

식별 태그([S], [C], [X]) 및 결함 내용을 기반으로 분석 결과를 1차 테스트와 비교

| 결함 유형 구분 |        |                              | 설명 | 1차 | 2차 | 3차 |
|----------|--------|------------------------------|----|----|----|----|
| 환경적 이슈   | 환경미비   | 화면 로딩 불가                     |    | 2  | 0  | 0  |
|          | 스키마 권한 | 결과서 쿼리에 스키마명 보완, 스키마 권한 필요   |    | 34 | 0  | 0  |
|          | 프로세스   | 프로시저 호출 오류                   |    | 18 | 14 | 6  |
|          | 문서     | 테스트 결과서 내 증적이 미흡             |    | 32 | 4  | 12 |
| 기능적 이슈   | 기능     | 시나리오 내 테스트 케이스 비정상 동작        |    | 99 | 87 | 32 |
|          | 값검증    | 테스트 결과 값 오류                  |    | 9  | 6  | 0  |
|          | 화면     | 구현 화면의 비정상                   |    | 3  | 8  | 0  |
|          | 데이터누락  | 테스트를 위한 데이터가 불충분             |    | 26 | 2  | 6  |
|          | 권한누락   | 테스트를 위한 요구 권한 누락             |    | 6  | 0  | 0  |
| 기타       | 공통화면   | 공통 체크리스트의 구현 불충분             |    | 9  | 39 | 32 |
|          | 결함아님   | 결함이 아님 → 테스터 오기입 또는 로직 이해 부족 |    | 7  | 97 | 1  |

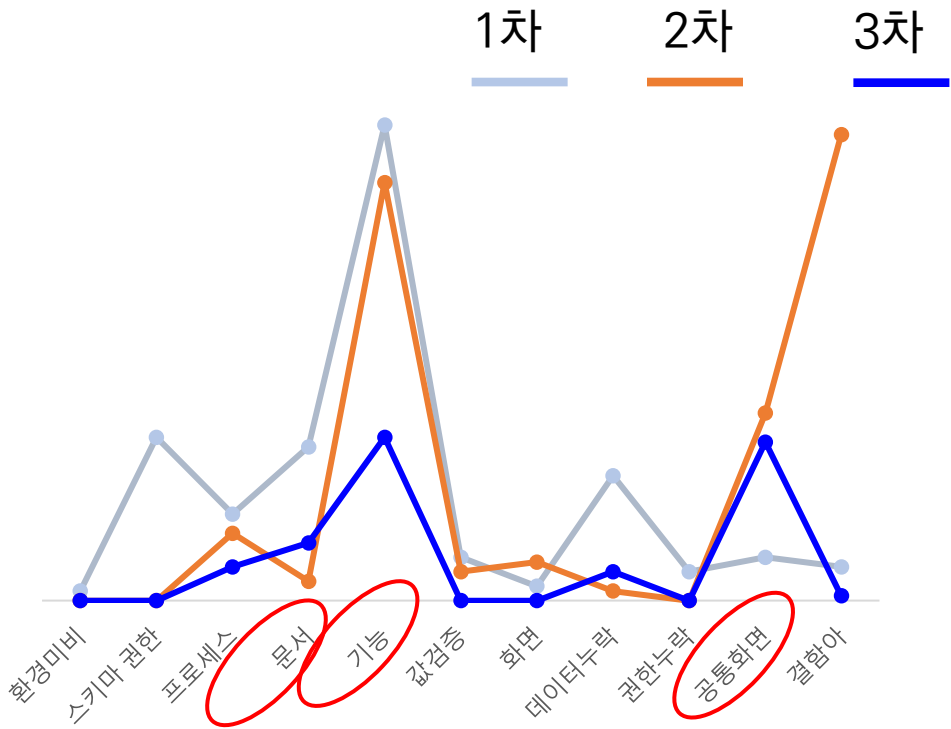

- 기능 테스트 수행에 집중하며, 기능 결함을 도출 함
- 기능 수정/개선에 따른 테스트 결과서 현황화 미흡이 확인 됨
- 공통 체크리스트에 전담 인력 배치로 공통 결함의 비율이 높음
- 환경적 이슈로 발생하는 결함은 감소



| 업무영역           |               | 총 대상 | 결함 유형 |    |    |       |       |    |    |
|----------------|---------------|------|-------|----|----|-------|-------|----|----|
|                |               |      | 프로세스  | 문서 | 기능 | 화면/공통 | 데이터누락 | 기타 | 계  |
| 공항운영관리<br>AOMS | 예측관리(PM)      | 29   | 0     | 0  | 3  | 0     | 0     | 0  | 3  |
|                | 항공보안(FS)      | 0    | 0     | 0  | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  |
|                | 공항운영(GO)      | 28   | 0     | 7  | 0  | 13    | 0     | 1  | 21 |
|                | 항공통계포털(AS)    | 121  | 2     | 1  | 3  | 9     | 3     | 0  | 18 |
|                | 공동관리(AOMS-CA) | 7    | 0     | 1  | 1  | 0     | 0     | 0  | 2  |
| 운항정보관리<br>FIMS | A-CDM(CM)     | 36   | 0     | 0  | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  |
|                | 공동관리(FIMS-CA) | 13   | 0     | 0  | 2  | 0     | 1     | 0  | 3  |
|                | 비상계획(CP)      | 20   | 0     | 0  | 2  | 0     | 0     | 0  | 2  |
|                | 운항계획(FP)      | 68   | 0     | 2  | 1  | 1     | 1     | 0  | 5  |
|                | 자원배정(RS)      | 30   | 4     | 1  | 2  | 3     | 0     | 0  | 10 |
|                | 항공기관제(AC)     | 16   | 0     | 0  | 5  | 3     | 1     | 0  | 9  |
| 상용             | 자원배정차트(RC)    | 0    | 0     | 0  | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  |
|                | SLOT관리(SLOT)  | 6    | 0     | 0  | 2  | 0     | 0     | 0  | 2  |
|                | 모바일(MES)      | 21   | 0     | 0  | 5  | 1     | 0     | 0  | 6  |
|                | 모바일(WES)      | 44   | 0     | 0  | 6  | 2     | 0     | 0  | 8  |
|                | 자원배정엔진(RE)    | 1    | 0     | 0  | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  |
|                | 푸시SW(PUSH)    | 0    | 0     | 0  | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  |
| 계              |               | 440  | 6     | 12 | 32 | 32    | 6     | 1  | 89 |

## Critical - 결함

DEF-04459 : [S\_1] 메뉴 접근 시 '-1 error : 데이터 예외사항입니다. 입력하신 데이터를 확인해 주세요.' 라는 alert이 호출되어 조회가 불가능합니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-MESRS081S ] 공용시설 신청

조회 조건

○ 스텝 전체결함 이력

● 해당결함 이력

[-] 완료 [DEF-04459] [S\_1] 메뉴 접근 시 '-1 error : 데이터 예외사항

결함검토요청

[3자테스트공통지훈]

2026-03-23

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

처리내용

결함내용

결함구분

결함

결함유형

기능

심각도

Critical

결함내용

[S\_1] 메뉴 접근 시 '-1 error : 데이터 예외사항입니다. 입력하신 데이터를 확인해 주세요.' 라는 alert이 호출되어 조회가 불가능합니다. 테스트했던 계정은 IDTEST05, IDTEST06입니다.

창조파일

찾기

확인

공용시설 신청

시설구분

전체

승인구분

전체

Aln

KE (대한항공)

시설구분

신청가능수량

데이터가 없습니다.

Incheon Airport 인천국제공항공사 | 인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업

15

아시아나 IDT 컨소시엄

Major - 결함

DEF-04522 : [S\_1] [S\_2] Date가 '2026-03-19' 이후일 땐 데이터 예외사항이라는 alert이 표출됩니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-WESCASY051S ] 프로그램 사용

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력    ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-04522] [S\_1] [S\_2] Date가 '2026-03-19' 이후일 땐 데이터 예외사항이라는 alert이 표출됩니다.

결함구분 결함 결함유형 기능 심각도 Major

완료등록일 PL 입력

첨조파일 찾기

결함내용 [S\_1] [S\_2] Date가 '2026-03-19' 이후일 땐 데이터 예외사항이라는 alert이 표출됩니다.

처리내용

결함내용

결함검토요청 [3자테스트공통지훈] 2026-03-24

조치요청 [임지훈 ▶ 홍성민] 2026-03-24 조치

확인요청 [홍성민 ▶ 임지훈] 2026-03-24 기존

확인요청 [임지훈 ▶ 3자테스터] 2026-03-30 해당

Program History

Date 2026-03-19

User ID

Module 전체

Menu Name

Program Name

| Request Date | User ID | User IP | Module ID | Menu ID | Menu Name | Program ID | P |
|--------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|
|--------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|

! 서버 오류입니다. 관리자에게 문의하세요. (문장이너더영문시작한다. 3자, 임지훈이관리자를찾아주세요.)

확인

Major

DEF-04600 : [X\_1] 페이지 초기 접근 시 운항실적 탭이 default로 선택되어있어 운항실적이 조회될 것으로 기대되나 그리드 영역에 '데이터가 없습니다.'라고 표출되어 데이터가 없는 것으로 오인될 여지가 있습니다. 탭 변경(여객실적 또는 화물실적) 후 운항실적으로 다시 탭 변경 시 정상적으로 데이터가 표출되어 확인 부탁드립니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

단위테스트 시나리오 : [ UT-AS38101S ] 첨부일 실적(운항실적)

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[ - ] 진행 [ DEF-04600 ] [X\_1] 페이지 초기 접근 시 운항실적 탭이 default로 선택

결함검토요청 [ 3자테스트공통은성 ] 2026-03-25

처리내용 결함내용

처리내용 결함내용

결함구분 결함 결함유형 프로세스 심각도 Major

원료목표일 PL 입력

참조파일 찾기

결함내용 [X\_1] 페이지 초기 접근 시 운항실적 탭이 default로 선택되어있어 운항실적이 조회될 것으로 기대되나 그리드 영역에 '데이터가 없습니다.'라고 표출되어 데이터가 없는 것으로 오인될 여지가 있습니다. 탭 변경(여객실적 또는 화물실적) 후 운항실적으로 다시 탭 변경 시 정상적으로 데이터가 표출되어 확인 부탁드립니다.

첨두일 실적

기종일자 2026-02-25 ~ 2026-03-25 기종별 전체 T1 T2

운항실적 여객실적 화물실적

결과성 상세

국제선 국내선 계

순위 일자 도착 운항 계 도착 운항 계 도착 운항 계

그리드설정

- 순위
- 일자
- 국제선
- 도착
- 출발
- 계
- 국내선
- 도착
- 출발
- 계

데이터가 없습니다.

Minor

DEF-04464 : [S\_4] '선택적 개인정보 수집 이용내역' 이 '필수'가 아닌 '선택' 항목으로 동작하지만 같은 '[필수]' section 하에 존재하여 '필수'로 느껴집니다. 선택 항목이라면 section을 분리하거나, (선택) 등으로 명확히 분리하면 좋을 것 같습니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

단위테스트 시나리오 : [ UT-MESCA401S ] 사용자 계정 신청

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-04464] [S\_4] '선택적 개인정보 수집 이용내역' 이 '필수'가 아닌 '선택' 항목으로 동작하지만 같은 '[필수]' section 하에 존재하여 '필수'로 느껴집니다. 선택 항목이라면 section을 분리하거나, (선택) 등으로 명확히 분리하면 좋을 것 같습니다.

- 결함검토요청 [ 3자테스터 임지훈 ] 2026-03-23
- 조치요청 [ 임지훈 ▶ 이수빈 ] 2026-03-24 조치 부탁 드
- 확인요청 [ 이수빈 ▶ 임지훈 ] 2026-03-26 해당 내용 처
- 확인요청 [ 임지훈 ▶ 3자테스터 임지훈 ] 2026-03-30 개인정보 수집

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

처리내용 결함내용

저장

결함구분 개선/변경 결함유형 UI 심각도 Minor

완료목표일 PL 입력

참조파일 찾기

결함내용 [S\_4] '선택적 개인정보 수집 이용내역' 이 '필수'가 아닌 '선택' 항목으로 동작하지만 같은 '[필수]' section 하에 존재하여 '필수'로 느껴집니다. 선택 항목이라면 section을 분리하거나, (선택) 등으로 명확히 분리하면 좋을 것 같습니다.

선택적 개인정보 수집 이용내역 미동의 동의

다음

Help Desk 032-741-6320, 6321 | 개인정보처리방침

section.application-step-section 358 x 235.59

Padding 10px 15px

ACCESSIBILITY

Name

기능

DEF-04444 : [X\_005]메세지가 부정확함. NAME 혹은 vALUE를 입력하지 않으면 서버오류라고 메세지 처리 됨

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-RSPK012

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력

[ - ] 완료 [ DEF-04444 ] [ X\_005 ]메세지가 부정

결함검토요청 [ 김승무 ▶ 유

조치요청 [ 유경섭 ▶ 장

확인요청 [ 장동혁 ▶ 유

확인요청 [ 유경섭 ▶ 김

최종확인 [ 김승무 ▶

처리내용

결함내용

처리내용

결함내용

결함구분 결함 결함유형 표준 심각도 Minor

완료목록일 PL 입력

참조파일 찾기

결함내용

[X\_005]메세지가 부정확함  
NAME 혹은 vALUE를 입력하지 않으면 서버오류라고 메세지 처리 됨  
--> 필수항목 오류로 표기

1. Name 혹은 Value를 입력 하지 않으면 서버오류로 메세지 나옴

Assign Variables

Resource Schedule > Stand chart > Rules > Assign Variables

ID Z

Variable List

| Type | ID              | Name    | Value | DESC. |
|------|-----------------|---------|-------|-------|
| Z1   | SZ1000000000000 | Z1 TEST | Y     |       |
| Z2   | SZ2111111111111 | Z2TEST  | N     |       |
| Z3   | Z3              |         |       |       |
| Z4   | Z4              |         |       |       |
| Z5   | Z5              |         |       |       |
| Z6   | Z6              |         |       |       |
| Z7   | Z7              |         |       |       |
| Z8   | Z8              |         |       |       |
| Z9   | Z9              |         |       |       |

서버 오류입니다.  
관리자에게 문의하세요.  
(데이터 재작성권 위반입니다.)

확인

기능

DEF-03403 : [S\_5] [S\_10] '+', '-' 버튼이 보이지 않습니다(표출 선행조건이 있는 것인지 모르겠습니다).

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-MESMF2015 ] A-CDM

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[ - ] 진행 [DEF-04587] [S\_5] [S\_10] '+', '-' 버튼이 보이지 않음

L 결함검토요청 [ 3자테스트공공지훈 ] 2026-04-01

L 조치요청 [ 임지훈 ▶ 임지훈 ] 2026-04-01

L 확인요청 [ 임지훈 ▶ 3자테스트공공지훈 ] 2026-04-01

처리내용

결함내용

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

처리내용

결함내용

처리상태

확인요청

현재처리자

임지훈

다음처리자

3자테스트

요청내용

+ - 버튼이 보이도록 조치 하였습니다.

참조파일

찾기

A-CDM 통계

A-CDM 통계

외부서비스 > ES ADMIN > A-CDM 통계

통계구분

전체

수집일자

2026-04-01 ~ 2026-04-01

통계 목록

| No. | 집계일자         | 통계구분                | 등록자    | 등록일시                |
|-----|--------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1   | 2026-04-01 수 | 항공 교통량 현황 [Day]     | jkds10 | 2026-04-01 15:20:24 |
| 2   | 2026-04-01 수 | 항공 교통량 현황 [Week]    | jkds10 | 2026-04-01 15:20:54 |
| 3   | 2026-04-01 수 | 항공 교통량 현황 [Year]    | jkds10 | 2026-04-01 15:20:29 |
| 4   | 2026-04-01 수 | 출발 교통량 순위 [Airline] | jkds10 | 2026-04-01 15:21:04 |



데이터

DEF-04638: [국가별 취항도시 공통(AS40805S, AS40806S, AS40807S)] [S\_2] 데이터가 존재하지 않아 확인이 불가능합니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-AS40805S ] 취항실적 - 국

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력    ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-04638] [국가별 취항도시 공통(AS40805S, AS40806S, AS40807S)]

결함검토요청 [ 3자단위테스트공통은성 ] 2026-03-25

처리내용

결함내용

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

처리내용

결함내용

결함구분

결함

결함유형

데이터

심각도

Minor

완료등록일

← PL 입력

참조파일

찾기

결함내용

[국가별 취항도시 공통(AS40805S, AS40806S, AS40807S)] [S\_2] 데이터가 존재하지 않아 확인이 불가능합니다.

취항실적

HOME > 취항 > 취항실적 > 취항실적

기준일자 2020-01-01 ~ 2026-03-24    터미널 전체 T1 T2    검색 초기화

취항항공사(정기)    취항국가실적(정기)    취항항공사(부정기)    취항국가실적(부정기)    **국가별 취항도시**    국가별 취항도시(여객)    국가별 취항도시(화물)

업고장 상태    그리드    차트    단위: 대    정렬초기화    행열전환    다운로드

순번    대분류    소분류    국가명    도시명

데이터가 없습니다.

그리드설정

차트설정

순번

대분류

소분류

국가명

도시명



문서

DEF-04660 : [S\_1]증적 누락

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-AS41501S ] 취항항공사별 취항도시 실적 닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-04660] [S\_1] 증적 누락 목표일 : 미입력

↳ 결함검토요청 [ 3자테스트공통은성 ] 2026-03-25

처리내용 결함내용

|       |         |      |     |     |       |
|-------|---------|------|-----|-----|-------|
| 결함구분  | 결함      | 결함유형 | 문서화 | 심각도 | Minor |
| 완료목표일 | ← PL 입력 |      |     |     |       |

|      |             |
|------|-------------|
| 결함내용 | [S_1] 증적 누락 |
|------|-------------|

저장

문서

DEF-04484 : [X\_001]테스트 결과서가 Season Arrival/Departure Flight Schedule List 인데 Seasonal Arrive 내용으로 되어 있음

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-FPFS003R ] Seasonal Arrival/Departure Flight Schedule List

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함

[-] 진행 [DEF-04484] [X\_001]테스트 결과서가 Seasonal Arrive 내용으로 되어 있음

결함검토요청 [ 김승무 ▶ 장경진 ]

확인요청 [ 장경진 ▶ 김승무 ]

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

처리내용

결함내용

결함구분 개선/변경 결함유형 문서화 심각도 Minor

완료목표일  PL 입력

참조파일  찾기

결함내용

[X\_001]테스트 결과서가 Season Arrival/Departure Flight Schedule List 인데 Seasonal Arrive 내용으로 되어 있음

저장

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

결함구분 개선/변경 결함유형 문서화 심각도 Minor

완료목표일  PL 입력

참조파일  찾기

결함내용

[X\_001]테스트 결과서가 Season Arrival/Departure Flight Schedule List 인데 Seasonal Arrive 내용으로 되어 있음

저장

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업

단위테스트결과서[운항계획 (FP)]

2. 단위 시험 결과

시험 결과 증적

FP > SEASONAL SCHEDULE > Seasonal Flight List > Seasonal Arrival

시즌도착운항편 목록에서 PRINT 버튼을 클릭하면 Report designer로 연동되어 조회되는가?

Print 버튼을 클릭하면 레포트 화면이 정상 출력된다.

Seasonal Arr/Dep

Report

Incheon Airport | 인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업

24

아시아나 IDT 컨소시엄

표준

DEF-04528 : [C\_001] STATUS LIST BOX 상단 전체 표기

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

단위테스트 시나리오 : [ UT-FPFS091S ] Confirm S

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[ - ] 진행 [ DEF-04528 ] [ C\_001 ] STATUS LIST BOX 상단 전체

결함검토요청 [ 김승무 ▶ 장경진 ] 2026-03-

조치요청 [ 장경진 ▶ 현영광 ] 2026-03-

확인요청 [ 현영광 ▶ 장경진 ] 2026-03-

확인요청 [ 장경진 ▶ 김승무 ] 2026-03-

처리내용

결함내용

결함구분 개선/변경 결함유형 표준 심각도 Minor

완료목표일 

← PL 입력

참조파일 

찾기

결함내용 [C\_001] STATUS LIST BOX 상단 전체 표기

저장

1. STATUS 상단 빈칸에 전제 혹은 ALL 표기

Confirm Seasonal Codeshare Flight Flight Plan > SEASONAL SCHEDULE > Seasonal Codeshare Flight > Confirm Seasonal Codes

FLT 

SEARCH

 반기코드 W25 운항일자 2025-10-26 ~ 2026-03-28 

REFRESH

 AIRLINE ALL

| IDC | SSC | AOD | TOF | FLT   | FSD        | FED        | O/D | STT   | FST | IRR | CNL | TYS | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | V11 |
|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | W25 | A   | I   | 3S564 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | LEJ | 16:25 | F   |     |     | 77L |     | Y   |     |     |     |     |     |     |
|     | W25 | D   | I   | 3S564 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | LEJ | 23:40 | F   |     |     | 77L |     | Y   |     |     |     |     |     | PVG |
|     | W25 | A   | I   | 3S564 | 2025-11-04 | 2026-02-23 | LEJ | 16:55 | F   |     |     | 77L |     | Y   |     |     |     |     |     |     |
|     | W25 | D   | I   | 3S564 | 2025-11-05 | 2026-02-24 | LEJ | 00:05 | F   |     |     | 77L |     |     | Y   |     |     |     |     | PVG |

Incheon Airport 인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업

25

아시아나 IDT 컨소시엄

## 표준

DEF-04530 : 조회조건 시분 입력 시 정상적인 시분이 아닐 경우 오류 발생

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-GO12937S ] 주기장운영현황\_T1

조회 조건

☐ 스텝 전체결함 이력
 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행

[DEF-04530] 조회조건 시분 입력 시 정상적인 시분이 아닐 경우 오류 발생

목표일 : 미입력

결함검토요청

[ 3자테스트공통문호 ] 2026-03-24

처리내용

결함내용

신규

저장

프로세스

DEF-04449 : [S\_1-1] 'ORA-00904: "CRSL\_STAT\_CD": 부적합한 식별자' 라는 에러가 발생합니다.

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [ UT-RS-SP87 ] SP\_RS\_F

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ○ 해당결함 이력

[ - ] 진행 [ DEF-04449 ] [ S\_1-1 ] 'ORA-00904: "CRSL\_STAT

결함검토요청 [ 3자테스트공통경섭 ] 2026-

처리내용

결함내용

결함구분 결함 결함유형 데이터 심각도 Major

완료목표일 ← PL 입력

참조파일 찾기

결함내용

[S\_1-1] 'ORA-00904: "CRSL\_STAT\_CD": 부적합한 식별자' 라는 에러가 발생합니

결함내용

```
● INSERT INTO TN_RS_CRSL_DALY_OPER
SELECT '20250725' ALTMNT_YMD
, ALTMNT_SN, ARR_DALY_FLTSH_ID, ALTMNT_APLCN_CD, TMNL_ID, CRSL_NO, WAYO_ID, ACST_NO, GATE_NO, MAN
, EST_BGNG_DT, EST_END_DT, CHG_BGNG_DT, CHG_END_DT, LAST_BGNG_DT, LAST_END_DT, FRST_BAG_INPUT_DT,
, CRSL_LCK_YN, BAR_SE_CD, BAR_OPRTR_ID, PLAN_OPER_SE_CD, CRSL_OPER_RMRK_CN, CRSL_CHG_RSN_CD
, FRST_RGTR_ID, FRST_RGTR_IP_ADDR, FRST_REG_DT, LAST_MDFR_ID, LAST_MDFR_IP_ADDR
, CURRENT_TIMESTAMP AS LAST_MDFCN_DT
, ALTMNT_DT, TER_ID, CRSL_STAT_CD
FROM
(SELECT *
FROM TN_RS_CRSL_DALY_OPER
ORDER BY ALTMNT_YMD DESC, ALTMNT_SN DESC)
WHERE ROWNUM <= 2
```

2차 테스트 수행 시 도출된 결함에 대한 재발 방지 계획안과 비교하여 이행을 점검 함

| 결함 내용                               | 재발방지 방안                                                                                     | 이행 여부                   | 수행 결과 ( 2차 테스트 )        | 후속 계획                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 환경 및 배포 오류<br>(스키마 누락, DB 오브젝트 미존재) | 1. 배포 프로세스(CI/CD) 점검<br>2. 스키마 권한 임의 사용 금지 가이드                                              | 이행<br>이행                | 유사 결함 없음<br>유사 결함 없음    | 테스트 수행 시 체크리스트 지속 점검 |
| 문서 현행화 미흡<br>(산출물 증적 누락 등)          | 1. 단위 테스트 시나리오 보완                                                                           | 보완 필요                   | 유사 결함 발생(단, 발생 빈도 낮음)   | 지속 보완 수행             |
| 기능 및 로직 오류<br>(기능 오작동)              | 1. 코드 리뷰(Peer Review)<br>2. 산출물 기반 기능 구현<br>3. 쿼리 Tunning<br>- DA 지원을 통한 Query Tunning 수행 . | 보완 필요<br>보완 필요<br>보완 필요 | 결함 발생<br>결함 발생<br>결함 발생 | 강화된 활동 수행            |
| 공통 Checklist                        | 1. 공통 개발 가이드 반복 교육 ( 월간 )                                                                   | 보완필요                    | 결함 발생                   | 추가 점검 수행             |



○ 테스트관리자가 아닌 PL이 직접 사전점검 결과 기록

| 항목                 | 항목 설명                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| DATA 확보            | 테스트 수행을 위한 충분한 데이터가 확보 되었는가?                                  |
| TEST 결과서           | 테스트 시나리오별 결과서는 표준양식을 준수하여, 정확한 테스트케이스 별 증적을 첨부한 결과서가 준비 되었는가? |
| Application 권한 확인  | 테스트를 위한 기능별 사용자권한은 적절하게 부여된 테스트계정은 준비 있는가?                    |
| DB 접근권한 확인(SP 테스트) | 테스트를 위한 DB 접근권한은 적절하게 부여 되고, 테스트계정은 준비되어 있는가?                 |
| 테스트 장비 환경 셋팅       | 테스트를 위한 Application 접속은 원활한가?                                 |

점검일 : 2026.03.16

| 업무영역        |               | 테스트수량  |        |      |     | DATA 확보 | TEST 결과서 | Application 권한 확인 | DB 접근권한 확인 (SP 테스트) | 테스트 장비 환경 셋팅 | 특이사항                                          |
|-------------|---------------|--------|--------|------|-----|---------|----------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 작성 예시       |               | OnLine | Report | 프로시저 | 440 | 미완료     | 작성중      | 미완료               | 미완료                 | 완료           | TEST를 위한 Application 계정 추가, SP 계정 추가          |
| 공항운영관리 AOMS | 예측관리(PM)      | 29     | 0      | 0    | 29  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 결과서 작성은 주말까지 작업이 필요 (03월23일 제출가능)             |
|             | 항공보안(FS)      | 0      | 0      | 0    | 0   | 미실시     | 미실시      | 미실시               | 미실시                 | 미실시          |                                               |
|             | 공항운영(GO)      | 19     | 1      | 8    | 28  | 준비중     | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |
|             | 항공통계포털(AS)    | 97     | 0      | 24   | 121 | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 테스트 결과서는 3월 20일까지 50% 이상 완료 25일 종료 예정         |
|             | 공통관리(AOMS-CA) | 6      | 0      | 1    | 7   | 완료      | 완료       | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |
| 운항정보관리 FIMS | A-CDM(CM)     | 4      | 0      | 32   | 36  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 테스트 결과서: 3월 23일까지 완료 예정                       |
|             | 공통관리(FIMS-CA) | 7      | 0      | 6    | 13  | 완료      | 완료       | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |
|             | 운항계획(FP)      | 17     | 0      | 51   | 68  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 결과서는 3/19일까지 작업                               |
|             | 비상계획(CP)      | 7      | 0      | 13   | 20  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 신규 추가된 CPFA070M(change History) 화면은 테스트 대상 제외 |
|             | 항공기관제(AC)     | 14     | 0      | 2    | 16  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | * AC03003E 테스트 대상 제외 : 요구사항 정의 지연 -> 개발일정 조정  |
| 외부서비스 ES    | 모바일(MES)      | 21     | 0      | 0    | 21  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 결과서 작성은 주말까지 작업이 필요 (03월23일 제출가능)             |
|             | 모바일(WES)      | 32     | 0      | 12   | 44  | 완료      | 작성중      | 완료                | 완료                  | 완료           | 결과서 작성은 주말까지 작업이 필요 (03월23일 제출가능)             |
| 상용 및 기타     | 자원배정차트(RC)    | 0      | 0      | 0    | 0   | 미실시     | 미실시      | 미실시               | 미실시                 | 미실시          | 테스트 없음                                        |
|             | SLOT관리(SLOT)  | 6      | 0      | 0    | 6   | 완료      | 완료       | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |
|             | 푸시SW(PUSH)    | 0      | 0      | 0    | 0   | 미실시     | 미실시      | 미실시               | 미실시                 | 미실시          |                                               |
|             | 자원배정(RS)      | 13     | 0      | 17   | 30  | 완료      | 완료       | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |
|             | 자원배정엔진(RE)    | 1      | 0      | 0    | 1   | 완료      | 완료       | 완료                | 완료                  | 완료           |                                               |

1. UI가 모듈별 동일하지 않음 ( 표, 그리드 등 ) : 표준 가이드에 따른 개발인지, 사용자 요구인지 확인 필요
2. 시나리오 증적 확인 필요
3. UI의 경우, 실무자의 사용성 / 사용 편의성을 테스터가 임의 판단이 어려움
4. 공통 CHECKLIST 준수한 개발 인지 ?
5. 테스트간 간헐적으로 속도저하가 확인됨 → 단위 기능 이슈가 아닌 인프라 전반으로 확인

E O D
